工　事　概　要　説　明　資　料

五洋・大本・井森特定建設工事共同企業体

1.工事概要

工　事　名	徳山下松港下松地区桟橋(-19m)築造工事
発　注　者	国土交通省　中国地方整備局
工 事 場 所	山口県下松市東海岸通り地先
工　　期	令和4年4月12日～令和5年12月4日
施　工　者	五洋・大本・井森特定建設工事共同企業体
工 事 数 量	本体工（ジャケット式）　1 式
	ジャケット製作　1 式
	ジャケット運搬・据付　1 式
	鋼杭工　1 式
	共通仮設工　1 式
目　　的	本工事は徳山下松港下松地区桟橋（-19m）(B2 ジャケット、B1 ジャケット)の本体工(ジャケット式)を施工するものです。
工事事務所	五洋・大本・井森特定建設工事共同企業体 下松桟橋工事事務所 山口県下松市笠戸町本浦67 TEL：0833-52-0691　FAX：0833-52-0692
現場代理人兼務	福本　臣起　(五洋)
監理技術者	
主任技術者	脇本　哲夫　(大本)
主任技術者	北條　和秀　(井森)

位　置　図

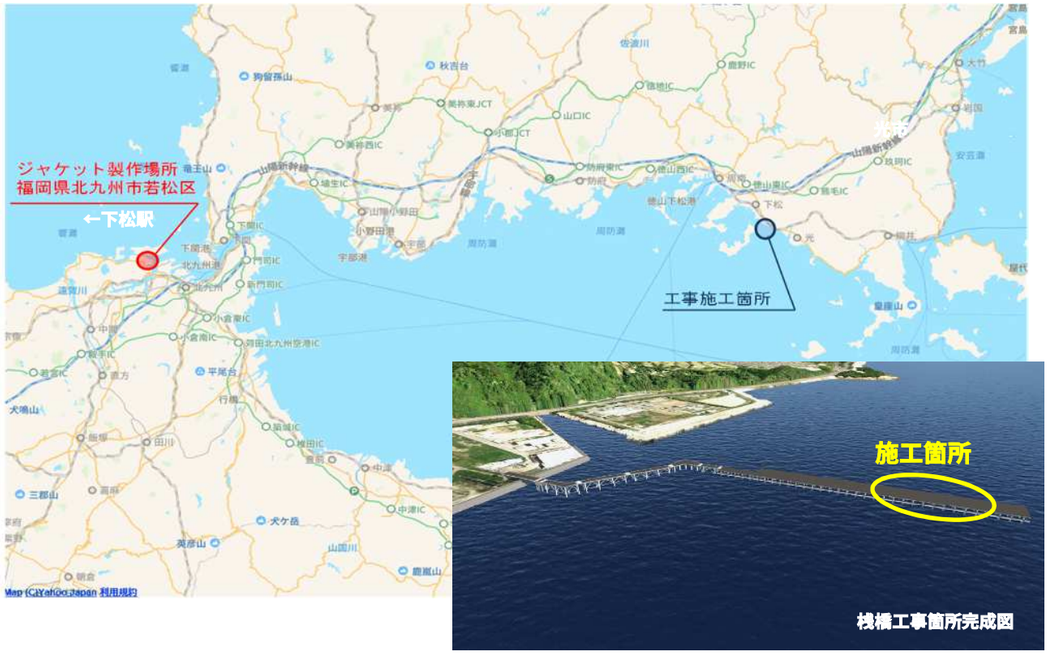

2.工事内容

工種名称	規格･形状･寸法	単位	数量	参考数量	摘　　要
桟橋部(B2ジャケット)					
本体工(ジャケット式)					
鋼杭工					
鋼杭	φ1,500	本	2	L=79.410m	A2,A4(先行杭)
	φ1,500	本	2	L=79.660m	C2,C4(先行杭)
	φ1,500	本	3	L=78.410m	A1,A3,A5(後打杭)
	φ1,500	本	5	L=78.535m	B1,B2.B3,B4,B5(後打杭)
	φ1,500	本	3	L=78.660m	C1,C3,C5(後打杭)
鋼管杭切断		本	15		ﾃﾞｨｽｸｶｯﾀｰ
ジャケット製作		基	1	921t/基	ｼﾞｬｹｯﾄ足場含む
				受衝版付防舷材2基	
				係船曲柱1基	
ジャケット運搬		基	1	1,012t/基	輸送固縛･ｼﾞｬｹｯﾄ足場含む
ジャケット据付					
据付		基	1	936t/基	
杭結合		式	1	ｸﾞﾗｳﾄ注入15本	

工種名称	規格･形状･寸法	単位	数量	参考数量	摘　　要
桟橋部(B1ジャケット)					
本体工(ジャケット式)					
鋼杭工					
鋼杭	φ1,500	本	2	L=79.410m	A2,A4(先行杭)
	φ1,500	本	2	L=79.660m	C2,C4(先行杭)
	φ1,500	本	3	L=78.410m	A1,A3,A5(後打杭)
	φ1,500	本	3	L=78.535m	B1,B2.B3(後打杭)
	φ1,500	本	3	L=78.660m	C1,C3,C5(後打杭)
鋼管杭切断		本	15		ﾃﾞｨｽｸｶｯﾀｰ
ジャケット製作		基	1	945t/基	
				受衝版付防舷材3基	
				係船曲柱3基	
ジャケット運搬		基	1	1,036t/基	輸送固縛･ｼﾞｬｹｯﾄ足場含む
ジャケット据付					
据付		基	1	960t/基	ｼﾞｬｹｯﾄ足場含む
杭結合		式	1	ｸﾞﾗｳﾄ注入15本	
共通仮設					
共通仮設工					
回航･えい航		式	1		
運搬		式	1		
準備		式	1		
安全		式	1		
技術管理		式	1		
水雷･傷害保険		式	1		

3.計画工程表

工種		年月日	令和4年 4月	～	令和5年 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
準備･工場製作	式	1										
鋼管杭打設	本	28										
ジャケット運搬	基	2										
ジャケット据付	基	2										
杭結合他	式	1										
後片付け	式	1										
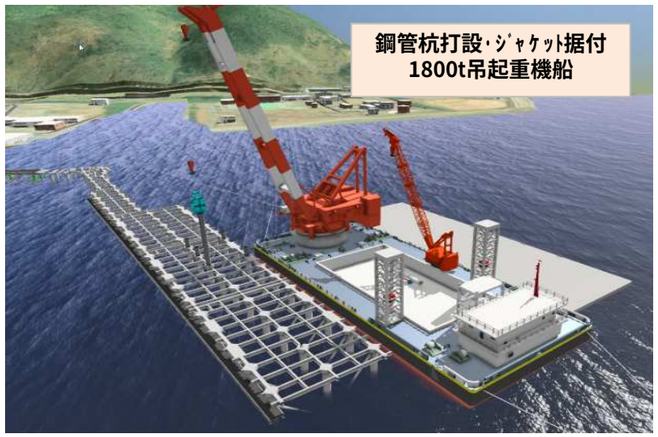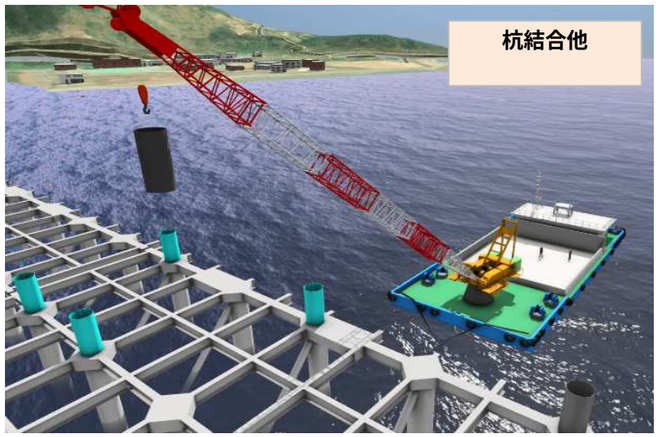
4.作業概要（イメージ図）
